

年度内全体スケジュール

- 住民対話 ●設計者
- 推進委員会 ●住民説明・パブコメ

12月5日 (金) 18時30分から

12月・1月(未定)

2月上旬

2月26日 (木) 14時から

2月下旬

3月上旬～3月中旬

3月中旬

3月23日 (月) 13時30分から

交流センター【ホール】意見交換会

福祉団体ヒアリング

事業費概算 提出

推進委員会(議題:基本設計(案)・事業費)

ライフサイクルコスト (LCC) 提出

パブリックコメント

住民説明会(2回開催)

推進委員会(最終回)

庁舎改築周辺整備事業における 整備スケジュール（案）

新庁舎周辺整備課

令和7年度



令和7年12月

- ・車庫の解体等に係る補正予算案提出
- ・老人福祉センター等解体に係る補正予算案提出（債務負担行為）

令和8年1月～3月

- ・議長車車庫、共用車車庫（病院側）、大型車車庫の解体
- ・ゴミプレハブ（病院側）の移転

(参考)

- ・町道鶴溜線拡幅工事（民有地手前まで）

令和8年度



令和8年 4月～

- ・解体に係る工事用道路の整備
- ・老人福祉センター等の解体

9月

- ・仮設倉庫の設置

10月

- ・仮設倉庫への移転


11月

- ・水防庫・詰所・駐輪場の解体
- ・防災倉庫の移転

(参考)

- ・町道鶴溜線拡幅工事
(民有地から中央公民館まで)

令和9年度～11年度

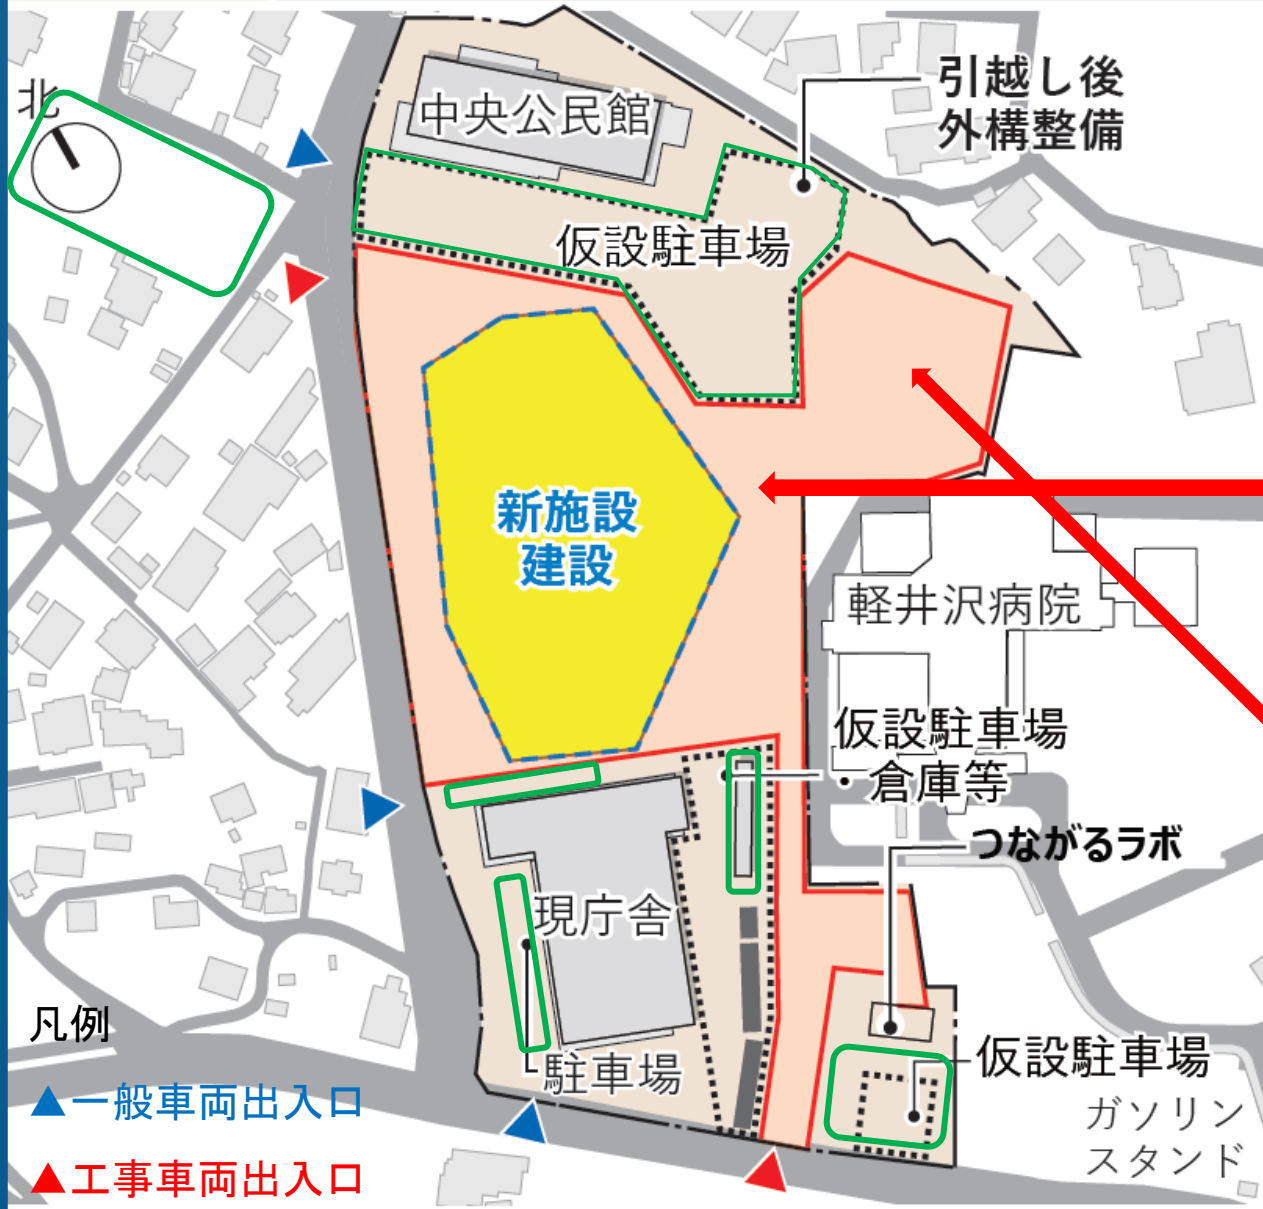

令和9年 6月頃

- ・ 本体工事入札
(速やかに)
- ・ 議決
(議決後)～令和11年 夏頃 (2年間)
- ・ 本体工事

令和11年 9月頃～

- ・ 外構工事① (駐車場・倉庫他)

令和11年 秋頃

- ・ 新施設供用開始

(令和11年度末～)令和12年度



令和12年 2月頃～

- ・旧庁舎、中央公民館、共用車庫（庁舎側）、つながるラボの解体

令和13年 2月頃～

- ・外構工事②（新設道路・駐車場他）
